

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Enero / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	12/02/2018
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	205,800,000.00	Plazo de ejecución	89.74%
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00 37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00 62.02%

Gráfica de Ejecución

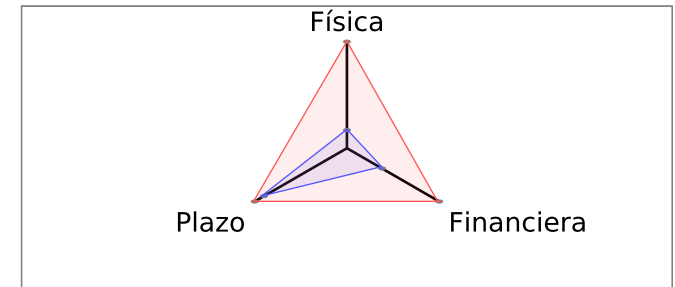

● Planificado ● Ejecutado

Tipo de cambio: 7.35 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Enero		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	0	Ejecución Financiera	0.00%
Presupuesto Vigente anual	145,000,000.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	0.00% / 0.00%		
Presupuesto Devengado	15,220,703.14	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	0.00% / 0.00%		
Porcentaje de Ejecución	10.50%	Próximo desembolso del mes	Febrero	Plazo de ejecucion Actual	98.00%		
		Presupuesto planificado próximo	8,507,618.40	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8.3499		


Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	1082		0		0		1082	
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros									
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Suministros de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	46		0		0		46	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	12/02/2018		19/02/2018		12/03/2018		13/03/2018		14/03/2018	
Suministros de oficina											
Toner, tintas	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	
Equipo de cómputo											
Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escaner	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

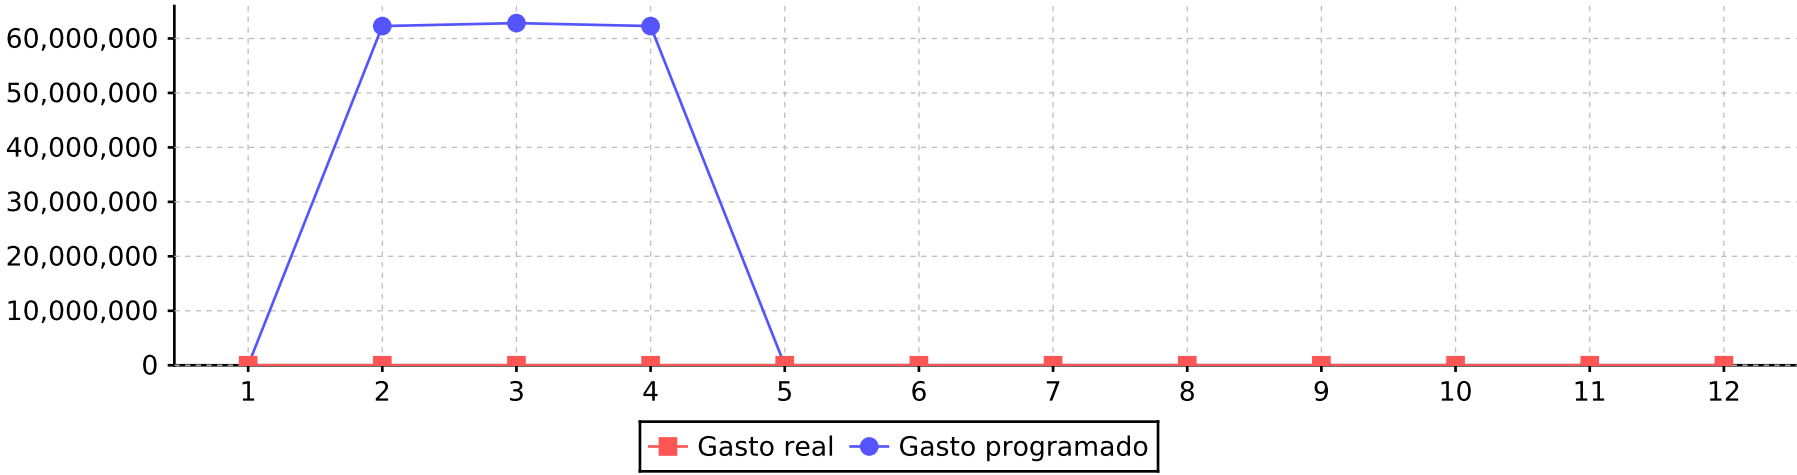

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	62,278,140.15	62,823,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												0.00
Total Gasto programado												187,379,418.44

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1	Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa.	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	41%			\$29,194,334.70		\$4,266,371.92				S
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	39%			\$28,882,728.60		\$3,954,765.82				S
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	338 días	lun 22/08/16	vie 29/12/17	lun 22/08/16	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				S
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	338 días	lun 22/08/16	vie 29/12/17	lun 22/08/16	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				S
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
6	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
7	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
8	Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 07/11/16	mar 30/08/16	lun 07/11/16	100%	5		\$0.00		\$0.00				S
9	Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 07/11/16	mar 08/11/16	lun 07/11/16	mar 08/11/16	100%	7		\$0.00		\$0.00				S
10	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	100%	8,9		\$0.00		\$0.00				S
11	Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 09/11/16	mar 15/11/16	mié 09/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00		\$0.00				S
12	Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00		\$0.00				S
13	Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00		\$0.00				S
14	NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00		\$0.00				S
15	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	100%	14		\$0.00		\$0.00				S
16	Preparación de Ofertas	25 días	vie 02/12/16	jue 12/01/17	vie 02/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				S
17	Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8 días		\$0.00		\$0.00				S
18	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				S
19	Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16,18		\$0.00		\$0.00				S
20	Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20,21		\$0.00		\$0.00				S
21	Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 02/03/17	vie 13/01/17	jue 02/03/17	100%	22		\$0.00		\$0.00				S
22	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 03/03/17	mar 18/04/17	vie 03/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00		\$0.00				S
23	No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00		\$0.00				S
24	Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 04/05/17	vie 28/04/17	jue 04/05/17	100%	26		\$0.00		\$0.00				S
25	Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00		\$0.00				S
26	Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	jue 18/05/17	mié 07/06/17	100%	28		\$0.00		\$0.00				S
27	Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17	jue 08/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00		\$0.00				S
28	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00		\$0.00				S
29	Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				S
30	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				S
31	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				S
32	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				S
33	Lote 1	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$206,258.93		\$206,258.93				S
34	Lote 2	101 días	vie 21/07/17	jue 14/12/17	vie 21/07/17	jue 14/12/17	100%	32		\$150,011.18		\$150,011.18				S
35	Lote 3	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$169,704.26		\$169,704.26				S
36	Lote 4	106 días	vie 21/07/17	jue 21/12/17	vie 21/07/17	jue 21/12/17	100%	32		\$110,509.86		\$110,509.86				S
37	Lote 5	108 días	vie 21/07/17	mar 26/12/17	vie 21/07/17	mar 26/12/17	100%	32		\$167,651.78		\$167,651.78				S
38	Lote 6	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%	32		\$107,673.62		\$107,673.62				S
39	Lote 7	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$233,899.77		\$233,899.77				S
40	Lote 8	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$167,691.70		\$167,691.70				S
41	Lote 9	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$91,597.97		\$91,597.97				S
42	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
43	1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	33%			\$27,477,729.53		\$2,549,766.75				S
44	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	385 días	lun 22/08/16	mar 06/03/18	lun 22/08/16	NOD	32%			\$16,359,517.45		\$2,549,766.75				S
45	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
46	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
47	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
48	Preparación de Bases de Licitación y aprobación Interna	9 días	lun 29/08/16	jue 08/09/16	lun 29/08/16	jue 08/09/16	100%	85		\$0.00		\$0.00				S
49	Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de Licitación	18 días	vie 09/09/16	mié 05/10/16	vie 09/09/16	mié 05/10/16	100%	87		\$0.00		\$0.00				S
50	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e internacionales	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	100%	88		\$0.00		\$0.00				S
51	Preparación de Ofertas	38 días	vie 14/10/16	mar 06/12/16	vie 14/10/16	mar 06/12/16	100%	89CC		\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
52	Reunión aclaratoria	1 día	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	100%	90CC+13 días		\$0.00		\$0.00				S
53	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	100%	89CC+7 días		\$0.00		\$0.00				S
54	Recepción de Ofertas	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	90,92,93		\$0.00		\$0.00				S
55	Apertura de las Ofertas	0 días	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	94CC,95		\$0.00		\$0.00				S
56	Evaluación de las Ofertas	36 días	mié 07/12/16	jue 02/02/17	mié 07/12/16	jue 02/02/17	100%	96,97		\$0.00		\$0.00				S
57	Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	47 días	vie 03/02/17	mar 11/04/17	vie 03/02/17	mar 11/04/17	100%	98		\$0.00		\$0.00				S
58	No Objeción a la Adjudicación	8 días	mié 12/04/17	vie 21/04/17	mié 12/04/17	vie 21/04/17	100%	99		\$0.00		\$0.00				S
59	Comunicación de la Adjudicación	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	100%	100		\$0.00		\$0.00				S
60	Delegación de firma	8 días	jue 04/05/17	lun 15/05/17	jue 04/05/17	lun 15/05/17	100%	101		\$0.00		\$0.00				S
61	Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. Empresa A	283 días	mié 18/01/17	vie 02/03/18	mié 18/01/17	NOD	33%			\$5,161,542.03		\$993,074.68				S
62	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				S
63	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	104		\$0.00		\$0.00				S
64	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	105		\$0.00		\$0.00				S
65	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	106		\$0.00		\$0.00				S
66	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	107		\$0.00		\$0.00				S
67	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	108		\$0.00		\$0.00				S
68	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	107		\$0.00		\$0.00				S
69	Ejecución financiera de módulos	105 días	lun 02/10/17	vie 02/03/18	lun 02/10/17	NOD	4%			\$5,161,542.03		\$993,074.68				S
70	Ejecución física de módulos	282 días	mié 18/01/17	jue 01/03/18	mié 18/01/17	NOD	35%			\$0.00		\$0.00				S
71	Modulos Educativos Lote 1	282 días	mié 18/01/17	jue 01/03/18	mié 18/01/17	NOD	62%			\$0.00		\$0.00				S
72	Modulos Educativos Lote 8	105 días	lun 28/08/17	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
73	Modulos Educativos Ciudad Peronia	24 días	lun 11/12/17	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
74	Farex - Farex, S.A. Empresa B	203 días	mar 16/05/17	mar 06/03/18	mar 16/05/17	NOD	52%			\$3,803,527.72		\$1,000,013.63				S
75	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				S
76	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	895		\$0.00		\$0.00				S
77	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	896		\$0.00		\$0.00				S
78	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	897		\$0.00		\$0.00				S
79	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	898		\$0.00		\$0.00				S
80	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	899		\$0.00		\$0.00				S
81	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	898		\$0.00		\$0.00				S
82	Ejecución financiera de módulos	60 días	lun 30/10/17	jue 25/01/18	lun 30/10/17	NOD	1%			\$3,803,527.72		\$1,000,013.63				S
83	Ejecución física de módulos	88 días	lun 30/10/17	mar 06/03/18	lun 30/10/17	NOD	57%			\$0.00		\$0.00				S
84	Modulos Educativos Lote 2	71 días	lun 30/10/17	vie 09/02/18	lun 30/10/17	NOD	53%			\$0.00		\$0.00				S
85	Modulos Educativos Lote 7	88 días	lun 30/10/17	mar 06/03/18	lun 30/10/17	NOD	61%			\$0.00		\$0.00				S
86	Modulos Educativos Ciudad Peronia	25 días	vie 12/01/18	jue 15/02/18	vie 12/01/18	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
87	Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C	191 días	mar 16/05/17	vie 16/02/18	mar 16/05/17	NOD	13%			\$7,394,447.70		\$556,678.44				S
88	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				S
89	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1659		\$0.00		\$0.00				S
90	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1660		\$0.00		\$0.00				S
91	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1661		\$0.00		\$0.00				S
92	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1662		\$0.00		\$0.00				S
93	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1663		\$0.00		\$0.00				S
94	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1662		\$0.00		\$0.00				S
95	Ejecución financiera de módulos	71 días	lun 16/10/17	vie 26/01/18	lun 16/10/17	NOD	11%			\$7,394,447.70		\$556,678.44				S
96	Ejecución física de módulos	105 días	lun 18/09/17	vie 16/02/18	lun 18/09/17	NOD	12%			\$0.00		\$0.00				S
97	Modulos Educativos Lote 3	103 días	lun 18/09/17	mié 14/02/18	lun 18/09/17	NOD	23%			\$0.00		\$0.00				S
98	Modulos Educativos Lote 4	74 días	mar 10/10/17	vie 26/01/18	mar 10/10/17	NOD	8%			\$0.00		\$0.00				S
99	Modulos Educativos Lote 5	105 días	lun 18/09/17	vie 16/02/18	lun 18/09/17	NOD	26%			\$0.00		\$0.00				S
100	Modulos Educativos Lote 6	35 días	vie 03/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
101	Modulos Educativos Lote 9	31 días	lun 27/11/17	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
102	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	315 días	vie 10/02/17	mar 15/05/18	vie 10/02/17	NOD	69%			\$11,118,212.08		\$0.00				S
103	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
104	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
105	Proceso de Adquisición	161 días	lun 15/05/17	vie 05/01/18	lun 15/05/17	NOD	93%			\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
106	Preparación de Bases de Licitación y Aprobación Interna	8 días	lun 15/05/17	jue 25/05/17	lun 15/05/17	jue 25/05/17	100%	2939		\$0.00		\$0.00				s
107	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	9 días	vie 26/05/17	mié 07/06/17	vie 26/05/17	mié 07/06/17	100%	2941		\$0.00		\$0.00				s
108	No objeción a los Documentos de Licitación	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	jue 08/06/17	vie 09/06/17	100%	2943		\$0.00		\$0.00				s
109	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e Internacionales	17 días	lun 12/06/17	mar 04/07/17	lun 12/06/17	mar 04/07/17	100%	2944		\$0.00		\$0.00				s
110	Preparación de Ofertas	31 días	mar 04/07/17	dom 20/08/17	mar 04/07/17	dom 20/08/17	100%	2945		\$0.00		\$0.00				s
111	Reunión aclaratoria	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	100%	2945CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
112	Nombramiento del Comité de Evaluación	25 días	lun 26/06/17	lun 31/07/17	lun 26/06/17	lun 31/07/17	100%	2945CC+10 días		\$0.00		\$0.00				s
113	Recepción de Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	29,462,948		\$0.00		\$0.00				s
114	Apertura de las Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	2950CC		\$0.00		\$0.00				s
115	Evaluación de las Ofertas	37 días	mar 22/08/17	dom 15/10/17	mar 22/08/17	dom 15/10/17	100%	2952		\$0.00		\$0.00				s
116	Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	100%	2954		\$0.00		\$0.00				s
117	No Objeción a la Adjudicación	16 días	mar 17/10/17	mar 07/11/17	mar 17/10/17	mar 07/11/17	100%	2955		\$0.00		\$0.00				s
118	Comunicación de la Adjudicación	18 días	mié 08/11/17	vie 01/12/17	mié 08/11/17	vie 01/12/17	100%	2956		\$0.00		\$0.00				s
119	Delegación de firma	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2957		\$0.00		\$0.00				s
120	Elaboración del Contrato	30 días	mié 08/11/17	mar 19/12/17	mié 08/11/17	mar 19/12/17	100%	2957CC		\$0.00		\$0.00				s
121	Gestión de firmas de contrato	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	100%	2959		\$0.00		\$0.00				s
122	Emisión de Acuerdo Ministerial	5 días	jue 21/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2960		\$0.00		\$0.00				s
123	Notificación del Acuerdo	2 días	mié 03/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2961		\$0.00		\$0.00				s
124	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	vie 05/01/18	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%	2962		\$0.00		\$0.00				s
125	Orden de Compra o Contrato	2 días	mié 03/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2962CC		\$0.00		\$0.00				s
126	Módulos instalados y recepcionados	90 días	vie 05/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				s
127	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
128	Administración UE	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$311,606.10		\$311,606.10				s
129	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
130	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,234.74		\$130,234.74				s
131	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	178 días	vie 31/03/17	mié 13/12/17	vie 31/03/17	mié 13/12/17	100%			\$181,371.36		\$181,371.36				s
132	Preparación de Bases de Licitación	25 días	vie 31/03/17	lun 08/05/17	vie 31/03/17	lun 08/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
133	Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación	30 días	mar 09/05/17	lun 19/06/17	mar 09/05/17	lun 19/06/17	100%	3162		\$0.00		\$0.00				s
134	Aprobación Interna de Bases de Licitación	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	100%	3163		\$0.00		\$0.00				s
135	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	100%	3164		\$0.00		\$0.00				s
136	Preparación de Ofertas	33 días	mié 05/07/17	mar 22/08/17	mié 05/07/17	mar 22/08/17	100%	3165		\$0.00		\$0.00				s
137	Nombramiento del Comité de Evaluación	10 días	lun 17/07/17	lun 31/07/17	lun 17/07/17	lun 31/07/17	100%	3166CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
138	Recepción de Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	3166		\$0.00		\$0.00				s
139	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	3169CC		\$0.00		\$0.00				s
140	Evaluación de las Ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	mié 23/08/17	mar 29/08/17	100%	3169CC		\$0.00		\$0.00				s
141	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	0 días	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	100%	3171		\$0.00		\$0.00				s
142	No Objeción a la Adjudicación	4 días	mié 30/08/17	lun 04/09/17	mié 30/08/17	lun 04/09/17	100%	3172		\$0.00		\$0.00				s
143	Comunicación de la Adjudicación	3 días	mar 05/09/17	jue 07/09/17	mar 05/09/17	jue 07/09/17	100%	3173		\$0.00		\$0.00				s
144	Delegación de firma	7 días	jue 05/10/17	lun 16/10/17	jue 05/10/17	lun 16/10/17	100%	3174		\$0.00		\$0.00				s
145	Elaboración del Contrato	3 días	mar 17/10/17	jue 19/10/17	mar 17/10/17	jue 19/10/17	100%	3175		\$0.00		\$0.00				s
146	Gestión de firmas de contrato	2 días	vie 20/10/17	lun 23/10/17	vie 20/10/17	lun 23/10/17	100%	3176		\$0.00		\$0.00				s
147	Emisión de Acuerdo Ministerial	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	mar 24/10/17	jue 02/11/17	100%	3177		\$0.00		\$0.00				s
148	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	100%	3178		\$0.00		\$0.00				s
149	Entrega de vehículo	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	jue 23/11/17	mié 13/12/17	100%	3180		\$181,371.36		\$181,371.36				s
150	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
151	Elaboración de especificaciones técnicas	9 días	jue 05/10/17	mié 18/10/17	jue 05/10/17	mié 18/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
152	NOB a especificaciones	6 días	jue 19/10/17	jue 26/10/17	jue 19/10/17	jue 26/10/17	100%	3183		\$0.00		\$0.00				s

