

# Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Diciembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	14/01/2019		
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009		
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009		
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016		
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	216,720,000.00	Plazo de ejecución	100.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00	37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00	62.02%

## Gráfica de Ejecución

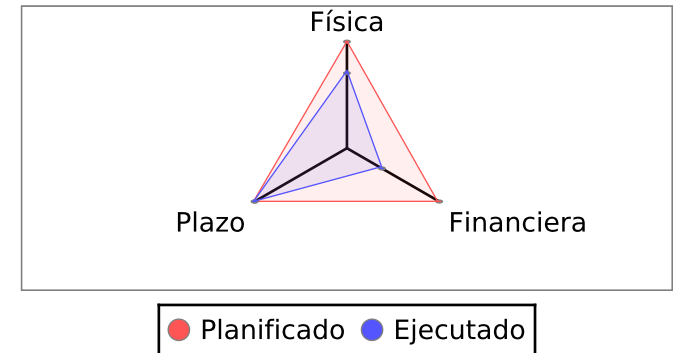

Tipo de cambio: 7.74 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Diciembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	18264390.02	Ejecución Financiera	65.00%
Presupuesto Vigente anual	118,324,536.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	105.18% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	118,324,534.19	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	63.15% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	100.00%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8.3499		

# Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
<b>Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.</b>									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	1082	265	0	460	0		1082	725
<b>Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros</b>									
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Suministros de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	46		0		0		46	


# Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	12/02/2018		19/02/2018		12/03/2018		13/03/2018		14/03/2018	
Suministros de oficina											
Toner, tintas	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	
Equipo de cómputo											
Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escaner	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	





# Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

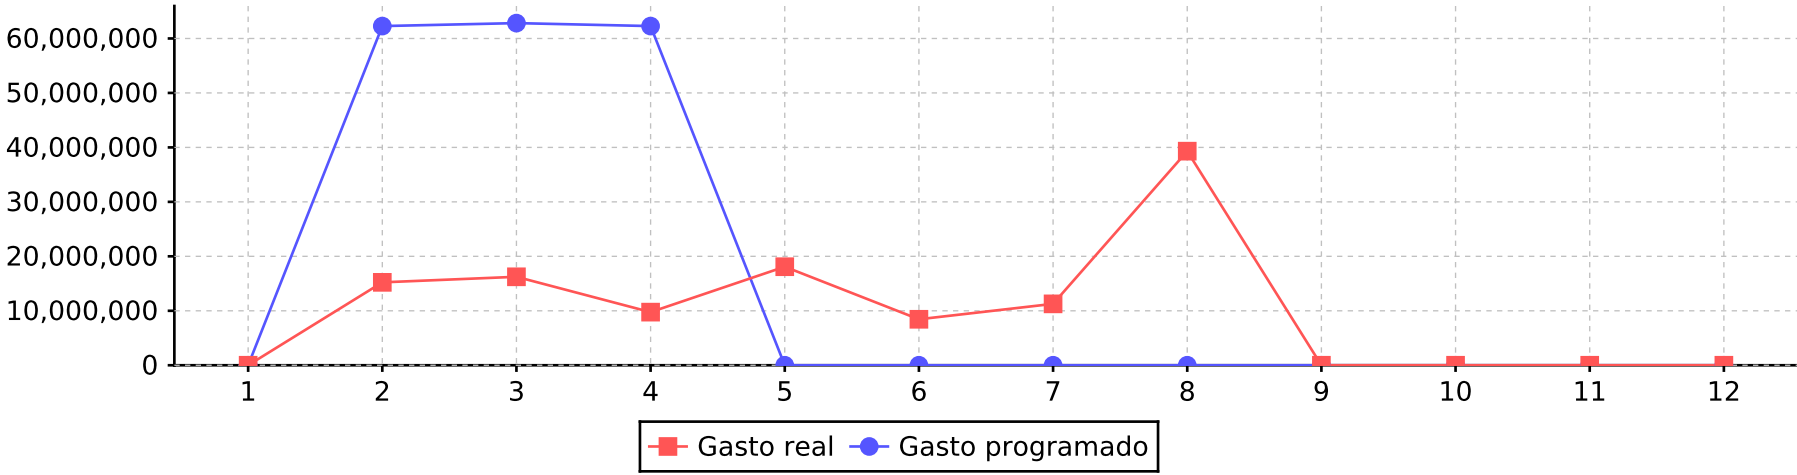

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>Gasto real</b>	0.00	15,220,703.14	16,239,501.38	9,752,216.14	18,091,794.14	8,440,143.40	11,269,792.38	39,310,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Gasto programado</b>	0.00	62,278,140.15	62,823,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Gasto real</b>												118,324,534.19
<b>Total Gasto programado</b>												187,379,418.44





Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
1	PEP_SMART_2018_FODES	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$20,120,336.53		\$20,120,336.53				S
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$19,808,710.44		\$19,808,710.44				S
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
6	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
7	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
8	Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 07/11/16	mar 30/08/16	lun 07/11/16	100%	5		\$0.00		\$0.00				S
9	Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 07/11/16	mar 08/11/16	lun 07/11/16	mar 08/11/16	100%	7		\$0.00		\$0.00				S
10	<del>-----Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas</del>	20 días	mié 09/11/16	mar 06/12/16	NOD	NOD	0%	8		\$0.00		\$0.00				S
11	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	100%	8,9		\$0.00		\$0.00				S
12	Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 09/11/16	mar 15/11/16	mié 09/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00		\$0.00				S
13	Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00		\$0.00				S
14	Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00		\$0.00				S
15	NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00		\$0.00				S
16	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	100%	14		\$0.00		\$0.00				S
17	Preparación de Ofertas	25 días	vie 02/12/16	jue 12/01/17	vie 02/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				S
18	Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8 días		\$0.00		\$0.00				S
19	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				S
20	<del>-----Enmienda a Bases de Licitación</del>	1 día	vie 13/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	0%	16		\$0.00		\$0.00				S
21	Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16,18		\$0.00		\$0.00				S
22	<del>-----Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse</del>	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	NOD	NOD	0%	20		\$0.00		\$0.00				S
23	Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20,21		\$0.00		\$0.00				S
24	<del>-----Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo</del>	8 días	lun 02/09/13	mié 11/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
25	Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 02/03/17	vie 13/01/17	jue 02/03/17	100%	22		\$0.00		\$0.00				S
26	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 03/03/17	mar 18/04/17	vie 03/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00		\$0.00				S
27	No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00		\$0.00				S
28	Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 04/05/17	vie 28/04/17	jue 04/05/17	100%	26		\$0.00		\$0.00				S
29	Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00		\$0.00				S
30	Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	jue 18/05/17	mié 07/06/17	100%	28		\$0.00		\$0.00				S
31	Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17	jue 08/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00		\$0.00				S
32	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00		\$0.00				S
33	Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				S
34	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				S
35	<del>-----Ofertas de Reserva</del>	2 días	mar 18/07/17	mié 19/07/17	NOD	NOD	0%	32CC		\$0.00		\$0.00				S
36	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
37	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
38	Lote 1	15 días	vie 01/09/17	vie 01/09/17	vie 01/09/17	vie 01/09/17	100%	32		\$206,104.63		\$206,104.63				S
39	Lote 2	24 días	vie 15/12/17	lun 22/01/18	vie 15/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$149,953.44		\$149,953.44				S
40	Lote 3	15 días	vie 01/09/17	vie 22/09/17	vie 01/09/17	vie 22/09/17	100%	32		\$169,577.30		\$169,577.30				S
41	Lote 4	20 días	jue 21/12/17	lun 22/01/18	jue 21/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$110,511.48		\$110,511.48				S
42	Lote 5	18 días	mar 26/12/17	lun 22/01/18	mar 26/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,659.58		\$167,659.58				S
43	Lote 6	17 días	vie 29/12/17	lun 22/01/18	vie 29/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$107,576.58		\$107,576.58				S
44	Lote 7	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$233,689.11		\$233,689.11				S
45	Lote 8	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,540.64		\$167,540.64				S
46	Lote 9	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$91,515.38		\$91,515.38				S
47	<del>-----Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general</del>	30 días	lun 02/09/13	vie 11/10/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
48	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
49	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
50	Proceso de Adquisición	150 días	mié 22/02/17	mar 26/09/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
51	Mobiliario (506) entregado y recepcionado	1237 días	lun-02/09/13	mié-11/07/18	NOD	NOD	0%			\$500,506.00		\$0.00				S
52	1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$18,404,582.30		\$18,404,582.30				S
53	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	705 días	lun 22/08/16	dom 16/06/19	lun 22/08/16	dom 16/06/19	100%			\$15,762,277.23		\$15,762,277.23				S
54	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
55	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
56	Preparación de Bases de Licitación y aprobación Interna	9 días	lun 29/08/16	jue 08/09/16	lun 29/08/16	jue 08/09/16	100%	112		\$0.00		\$0.00				S
57	Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de Licitación	18 días	vie 09/09/16	mié 05/10/16	vie 09/09/16	mié 05/10/16	100%	114		\$0.00		\$0.00				S
58	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e internacionales	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	100%	115		\$0.00		\$0.00				S
59	Preparación de Ofertas	38 días	vie 14/10/16	mar 06/12/16	vie 14/10/16	mar 06/12/16	100%	116CC		\$0.00		\$0.00				S
60	Reunión aclaratoria	1 día	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	100%	117CC+13 días		\$0.00		\$0.00				S
61	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	100%	116CC+7 días		\$0.00		\$0.00				S
62	Emisión a Bases de Licitación	8 días	mié-07/12/16	jue-15/12/16	NOD	NOD	0%	117		\$0.00		\$0.00				S
63	Recepción de Ofertas	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	117,119,120		\$0.00		\$0.00				S
64	<del>Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse</del>	44 días	jue-08/12/16	mar-14/02/17	NOD	NOD	0%	121		\$0.00		\$0.00				S
65	Apertura de las Ofertas	0 días	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	121CC,122		\$0.00		\$0.00				S
66	<del>Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo</del>	8 días	jue-08/12/16	vie-16/12/16	NOD	NOD	0%	123		\$0.00		\$0.00				S
67	Evaluación de las Ofertas	36 días	mié 07/12/16	jue 02/02/17	mié 07/12/16	jue 02/02/17	100%	123,124		\$0.00		\$0.00				S
68	Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	47 días	vie 03/02/17	mar 11/04/17	vie 03/02/17	mar 11/04/17	100%	125		\$0.00		\$0.00				S
69	No Objeción a la Adjudicación	8 días	mié 12/04/17	vie 21/04/17	mié 12/04/17	vie 21/04/17	100%	126		\$0.00		\$0.00				S
70	Comunicación de la Adjudicación	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	100%	127		\$0.00		\$0.00				S
71	Delegación de firma	8 días	jue 04/05/17	lun 15/05/17	jue 04/05/17	lun 15/05/17	100%	128		\$0.00		\$0.00				S
72	Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. - Empresa A	602 días	mié 18/01/17	mar 11/06/19	mié 18/01/17	mar 11/06/19	100%			\$5,093,217.85		\$5,093,217.85				S
73	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				S
74	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	131		\$0.00		\$0.00				S
75	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	132		\$0.00		\$0.00				S
76	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	133		\$0.00		\$0.00				S
77	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				S
78	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	135		\$0.00		\$0.00				S
79	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				S
80	<del>Registro de contrato en SIGES hasta obtención del NEG</del>	1 día	mié-12/07/17	mié-12/07/17	NOD	NOD	0%	137		\$0.00		\$0.00				S
81	Ejecución financiera de módulos	235 días	jue 19/10/17	vie 21/09/18	jue 19/10/17	vie 21/09/18	100%			\$5,093,217.85		\$5,093,217.85				S
82	Ejecución física de módulos	602 días	mié 18/01/17	mar 11/06/19	mié 18/01/17	mar 11/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				S
83	Farex, S.A. - Empresa B	278 días	mar 16/05/17	mar 19/06/18	mar 16/05/17	mar 19/06/18	100%			\$3,787,492.51		\$3,787,492.51				S
84	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				S
85	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	858		\$0.00		\$0.00				S
86	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	859		\$0.00		\$0.00				S
87	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	860		\$0.00		\$0.00				S
88	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	861		\$0.00		\$0.00				S
89	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	862		\$0.00		\$0.00				S
90	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	861		\$0.00		\$0.00				S
91	<del>Registro de contrato en SIGES hasta obtención del NEG</del>	1 día	lun-17/07/17	lun-17/07/17	NOD	NOD	0%	864		\$0.00		\$0.00				S
92	Ejecución financiera de módulos	129 días	jue 14/12/17	mar 19/06/18	jue 14/12/17	mar 19/06/18	100%			\$3,787,492.51		\$3,787,492.51				S
93	Ejecución física de módulos	120 días	lun 30/10/17	mié 18/04/18	lun 30/10/17	mié 18/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				S
94	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C	523 días	mar 16/05/17	dom 16/06/19	mar 16/05/17	dom 16/06/19	100%			\$6,881,566.87		\$6,881,566.87				S
95	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				S
96	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1386		\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
97	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1387		\$0.00		\$0.00				s
98	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1388		\$0.00		\$0.00				s
99	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1389		\$0.00		\$0.00				s
100	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1390		\$0.00		\$0.00				s
101	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1389		\$0.00		\$0.00				s
102	<del>Registro de contrato en SIGES hasta obtención del</del>	1 día	jue 20/07/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	0%	1392		\$0.00		\$0.00				s
103	Ejecución financiera de módulos	237 días	mié 18/10/17	vie 21/09/18	mié 18/10/17	vie 21/09/18	100%			\$6,881,566.87		\$6,881,566.87				s
104	Ejecución física de módulos	437 días	lun 18/09/17	dom 16/06/19	lun 18/09/17	dom 16/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
105	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	1287 días	dom 01/09/13	vie 21/09/18	dom 01/09/13	NOD	99%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
106	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
107	Proceso de Adquisición	218 días	lun 15/05/17	lun 26/03/18	lun 15/05/17	lun 26/03/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
108	Preparación de Bases de Licitación y Aprobación Interna	8 días	lun 15/05/17	jue 25/05/17	lun 15/05/17	jue 25/05/17	100%	2477		\$0.00		\$0.00				s
109	Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	15 días	lun 02/09/13	vie 20/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
110	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	9 días	vie 26/05/17	mié 07/06/17	vie 26/05/17	mié 07/06/17	100%	2479		\$0.00		\$0.00				s
111	No objeción a los Documentos de Licitación	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	jue 08/06/17	vie 09/06/17	100%	2481		\$0.00		\$0.00				s
112	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e Internacionales	17 días	lun 12/06/17	mar 04/07/17	lun 12/06/17	mar 04/07/17	100%	2482		\$0.00		\$0.00				s
113	Preparación de Ofertas	31 días	mar 04/07/17	vie 18/08/17	mar 04/07/17	vie 18/08/17	100%	2483		\$0.00		\$0.00				s
114	Reunión aclaratoria	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	100%	2483CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
115	Nombramiento del Comité de Evaluación	25 días	lun 26/06/17	lun 31/07/17	lun 26/06/17	lun 31/07/17	100%	2483CC+10 días		\$0.00		\$0.00				s
116	<del>Enmienda a Bases de Licitación</del>	28 días	mié 26/07/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	0%	2485		\$0.00		\$0.00				s
117	Recepción de Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	24,842,486		\$0.00		\$0.00				s
118	Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
119	Apertura de las Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	2488CC		\$0.00		\$0.00				s
120	<del>Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo</del>	8 días	lun 02/09/13	mié 11/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
121	Evaluación de las Ofertas	37 días	mar 22/08/17	vie 13/10/17	mar 22/08/17	vie 13/10/17	100%	2490		\$0.00		\$0.00				s
122	Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	100%	2492		\$0.00		\$0.00				s
123	No Objeción a la Adjudicación	16 días	mar 17/10/17	mar 07/11/17	mar 17/10/17	mar 07/11/17	100%	2493		\$0.00		\$0.00				s
124	Comunicación de la Adjudicación	18 días	mié 08/11/17	vie 01/12/17	mié 08/11/17	vie 01/12/17	100%	2494		\$0.00		\$0.00				s
125	Delegación de firma	11 días	lun 04/12/17	lun 18/12/17	lun 04/12/17	lun 18/12/17	100%	2495		\$0.00		\$0.00				s
126	Elaboración del Contrato	30 días	mié 08/11/17	mar 19/12/17	mié 08/11/17	mar 19/12/17	100%	2495CC		\$0.00		\$0.00				s
127	Gestión de firmas de contrato	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	100%	2497		\$0.00		\$0.00				s
128	Emisión de Acuerdo Ministerial	12 días	jue 21/12/17	jue 11/01/18	jue 21/12/17	jue 11/01/18	100%	2498		\$0.00		\$0.00				s
129	Notificación del Acuerdo	52 días	vie 12/01/18	lun 26/03/18	vie 12/01/18	lun 26/03/18	100%	2499		\$0.00		\$0.00				s
130	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	lun 26/03/18	lun 26/03/18	lun 26/03/18	lun 26/03/18	100%	2500		\$0.00		\$0.00				s
131	<del>Orden de Compra o Contrato</del>	2 días	vie 12/03/18	lun 15/03/18	NOD	NOD	0%	2500CC		\$0.00		\$0.00				s
132	Módulos instalados y recepcionados	1287 días	dom 01/09/13	vie 21/09/18	dom 01/09/13	NOD	99%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
133	Farex, S.A. - Empresa A	119 días	jue 05/04/18	vie 21/09/18	jue 05/04/18	vie 21/09/18	100%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
134	Ejecución financiera de módulos	83 días	vie 25/05/18	vie 21/09/18	vie 25/05/18	vie 21/09/18	100%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
135	Ejecución física de módulos	80 días	jue 05/04/18	vie 27/07/18	jue 05/04/18	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
136	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
137	Ejecución financiera de módulos	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
138	Ejecución física de módulos	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
139	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
140	Administración UE	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$311,626.09		\$311,626.09				s
141	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
142	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2017	238 días	lun 09/01/17	jue 14/12/17		NOB	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
143	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18		NOB	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
144	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18		NOB	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
145	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18		NOB	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
146	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18		NOB	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
147	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2018	145 días	lun 23/10/17	jue 17/05/18		NOB	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
148	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18		NOB	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
149	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18		NOB	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
150	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18		NOB	0%			\$9,863.00		\$0.00				S
151	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,224.09		\$130,224.09				S
152	Elaboración de TDR	3 días	lun 09/01/17	mié 11/01/17	lun 09/01/17	mié 11/01/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
153	Causa: Poco conocimiento-Riesgo:Trámites Engorrosos-Impacto: Atrazo en fechas planificadas	20 días	jue 12/01/17	mié 08/02/17		NOB	0%	4059		\$0.00		\$0.00				S
154	NOB a TDR	103 días	jue 12/01/17	jue 08/06/17	jue 12/01/17	jue 08/06/17	100%	4059,060		\$0.00		\$0.00				S
155	Publicación / Invitación	5 días	vie 14/04/17	vie 20/04/17		NOB	0%			\$0.00		\$0.00				S
156	Evaluación de postulantes	6 días	vie 09/06/17	vie 16/06/17	vie 09/06/17	vie 16/06/17	100%	4062		\$0.00		\$0.00				S
157	NOB a Evaluación	2 días	lun 19/06/17	mar 20/06/17	lun 19/06/17	mar 20/06/17	100%	4063		\$0.00		\$0.00				S
158	Gestión interna y firma de contrato	9 días	mié 21/06/17	lun 03/07/17	mié 21/06/17	lun 03/07/17	100%	4064		\$0.00		\$0.00				S
159	Pago mes Marzo	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17		NOB	0%	4065		\$24,000.00		\$0.00				S
160	Pago Mes Abril	18 días	lun 21/07/17	vie 25/08/17		NOB	0%	4066		\$24,000.00		\$0.00				S
161	Pago Mes Mayo	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17		NOB	0%	4067		\$24,000.00		\$0.00				S
162	Pago Mes Junio	1 día	mar 29/08/17	mar 29/08/17		NOB	0%	4068		\$24,000.00		\$0.00				S
163	Pago Mes Julio	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	mar 04/07/17	vie 28/07/17	100%	4069		\$19,754.85		\$19,754.85				S
164	Pago Mes Agosto	22 días	lun 31/07/17	mié 30/08/17	lun 31/07/17	mié 30/08/17	100%	4070		\$22,230.64		\$22,230.64				S
165	Pago Mes Septiembre	21 días	jue 31/08/17	vie 29/09/17	jue 31/08/17	vie 29/09/17	100%	4071		\$22,042.69		\$22,042.69				S
166	Pago Mes Octubre	21 días	lun 02/10/17	lun 02/10/17	mar 31/10/17	mar 31/10/17	100%	4072		\$22,063.93		\$22,063.93				S
167	Pago Mes Noviembre	21 días	mié 01/11/17	mié 29/11/17	mié 01/11/17	mié 29/11/17	100%	4073		\$22,065.64		\$22,065.64				S
168	Pago Mes Diciembre	14 días	vie 01/12/17	mié 20/12/17	vie 01/12/17	mié 20/12/17	100%	4074		\$22,066.34		\$22,066.34				S
169	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18		NOB	0%			\$98,630.18		\$0.00				S
170	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	180 días	vie 31/03/17	vie 15/12/17	vie 31/03/17	vie 15/12/17	100%			\$181,402.00		\$181,402.00				S
171	Preparación de Bases de Licitación	25 días	vie 31/03/17	lun 08/05/17	vie 31/03/17	lun 08/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
172	Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación	30 días	mar 09/05/17	lun 19/06/17	mar 09/05/17	lun 19/06/17	100%	4089		\$0.00		\$0.00				S
173	Aprobación Interna de Bases de Licitación	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	100%	4090		\$0.00		\$0.00				S
174	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	100%	4091		\$0.00		\$0.00				S
175	Preparación de Ofertas	33 días	mié 05/07/17	mar 22/08/17	mié 05/07/17	mar 22/08/17	100%	4092		\$0.00		\$0.00				S
176	Reunión aclaratoria	1 día	mié 12/07/17	NOB		NOB	0%	4093CC+5 días		\$0.00		\$0.00				S
177	Nombramiento del Comité de Evaluación	10 días	lun 17/07/17	lun 31/07/17	lun 17/07/17	lun 31/07/17	100%	4093CC+8 días		\$0.00		\$0.00				S
178	Recepción de Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	4093		\$0.00		\$0.00				S
179	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	4096CC		\$0.00		\$0.00				S
180	Evaluación de las Ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	mié 23/08/17	mar 29/08/17	100%	4096CC		\$0.00		\$0.00				S
181	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	0 días	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	100%	4098		\$0.00		\$0.00				S
182	No Objeción a la Adjudicación	4 días	mié 30/08/17	lun 04/09/17	mié 30/08/17	lun 04/09/17	100%	4099		\$0.00		\$0.00				S
183	Comunicación de la Adjudicación	3 días	mar 05/09/17	jue 07/09/17	mar 05/09/17	jue 07/09/17	100%	4100		\$0.00		\$0.00				S
184	Delegación de firma	7 días	jue 05/10/17	lun 16/10/17	jue 05/10/17	lun 16/10/17	100%	4101		\$0.00		\$0.00				S
185	Elaboración del Contrato	3 días	mar 17/10/17	jue 19/10/17	mar 17/10/17	jue 19/10/17	100%	4102		\$0.00		\$0.00				S
186	Gestión de firmas de contrato	2 días	vie 20/10/17	lun 23/10/17	vie 20/10/17	lun 23/10/17	100%	4103		\$0.00		\$0.00				S
187	Emisión de Acuerdo Ministerial	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	mar 24/10/17	jue 02/11/17	100%	4104		\$0.00		\$0.00				S
188	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	100%	4105		\$0.00		\$0.00				S
189	Orden de Compra	1 día	mié 23/11/17	mié 23/11/17		NOB	0%	4106		\$0.00		\$0.00				S
190	Entrega de vehículo	17 días	jue 23/11/17	vie 15/12/17	jue 23/11/17	vie 15/12/17	100%	4107		\$181,402.00		\$181,402.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
191	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
192	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2017	27 días	jue 01/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	0%			\$4,000.00		\$0.00				s
193	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2018 para su utilización en actividades administrativas de la unidad ejecutora	61 días	mar 02/01/18	mar 27/03/18	NOD	NOD	0%			\$6,000.00		\$0.00				s
194	Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina	27 días	mié 10/01/18	jue 01/03/18	NOD	NOD	0%			\$45,000.00		\$0.00				s
195	Proceso de Adquisición: Combustible	30 días	jue 01/06/17	mie 12/07/17	NOD	NOD	0%			\$60,000.00		\$0.00				s
196	Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018	20 días	jue 01/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	0%			\$5,136.99		\$0.00				s
197	Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el resguardo de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	vie 09/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD	0%			\$30,000.00		\$0.00				s
198	Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	0%			\$25,000.00		\$0.00				s
199	Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo	25 días	mié 10/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%			\$40,000.00		\$0.00				s
200	Monto pendiente de asignar	1 día	mié 04/04/18	mié 04/04/18	NOD	NOD	0%			\$0,897.75		\$0.00				s

## Observaciones / Desafíos

### Alertivos:



**Elaborado por: (nombre y firma)** Pablo Fernando Godoy Reyes

**Aprobado por: (nombre y firma)** Sr. David Estuardo Escobar Vega - Director Ejecutivo  
FODES



*David Estuardo Escobar Vega*  
Director Ejecutivo  
Fondo de Desarrollo Social  
-FODES-

**Fecha de actualización**

14/1/2019 - 7:56 AM
