

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Junio / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	09/07/2018		
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009		
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009		
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016		
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	209,720,000.00	Plazo de ejecución	100.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00	37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00	62.02%

Gráfica de Ejecución

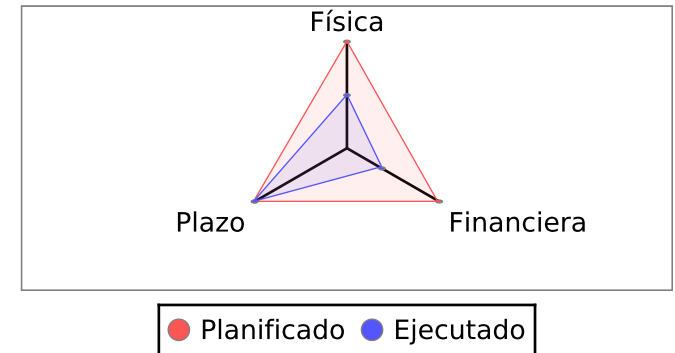

Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Junio		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	18264390.02	Ejecución Financiera	65.00%
Presupuesto Vigente anual	183,469,027.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	105.18% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	67,744,358.20	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	36.15% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	36.92%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8.3499		


Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	1082	265	0	159	0		1082	424
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros									
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Suministros de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	46		0		0		46	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	12/02/2018		19/02/2018		12/03/2018		13/03/2018		14/03/2018	
Suministros de oficina											
Toner, tintas	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	
Equipo de cómputo											
Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escaner	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

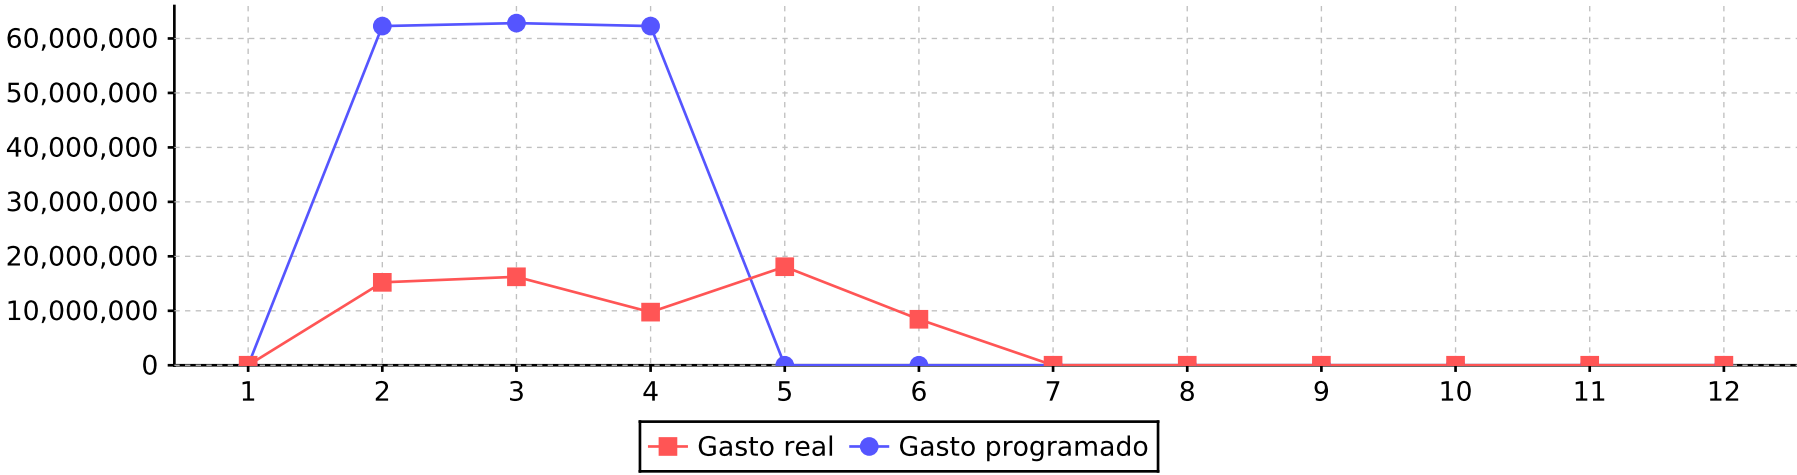

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	15,220,703.14	16,239,501.38	9,752,216.14	18,091,794.14	8,440,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	62,278,140.15	62,823,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												67,744,358.20
Total Gasto programado												187,379,418.44

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
1	PEP SMART 2018 FODES	494 días	lun 22/08/16	mié 08/08/18	lun 22/08/16	NOD	77%			\$28,937,436.41		\$13,302,786.13				S
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	494 días	lun 22/08/16	mié 08/08/18	lun 22/08/16	NOD	77%			\$28,625,799.67		\$12,991,149.39				S
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
6	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
7	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
8	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
9	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	NOD	99%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
10	Lote 1	15 días	vie 01/09/17	vie 22/09/17	vie 01/09/17	NOD	99%	32		\$206,104.63		\$206,104.63				S
11	Lote 2	24 días	vie 15/12/17	lun 22/01/18	vie 15/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$149,953.44		\$149,953.44				S
12	Lote 3	15 días	vie 01/09/17	vie 22/09/17	vie 01/09/17	NOD	99%	32		\$169,577.30		\$169,577.30				S
13	Lote 4	20 días	jue 21/12/17	lun 22/01/18	jue 21/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$110,511.48		\$110,511.48				S
14	Lote 5	18 días	mar 26/12/17	lun 22/01/18	mar 26/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,659.58		\$167,659.58				S
15	Lote 6	17 días	vie 29/12/17	lun 22/01/18	vie 29/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$107,576.58		\$107,576.58				S
16	Lote 7	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$233,689.11		\$233,689.11				S
17	Lote 8	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,540.64		\$167,540.64				S
18	Lote 9	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$91,515.38		\$91,515.38				S
19	-----Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general	30 días	lun 02/09/13	vie 11/10/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
20	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
21	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
22	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
23	Proceso de Adquisición	150 días	mié 22/02/17	mar 26/09/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
24	Preparación de Bases de Licitación	104 días	mar 16/05/17	mié 11/10/17	mar 16/05/17	mié 11/10/17	100%	76		\$0.00		\$0.00				S
25	Aprobación Interna de Bases de Licitación	0 días	jue 12/10/17	jue 12/10/17	jue 12/10/17	jue 12/10/17	100%	78		\$0.00		\$0.00				S
26	-----Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	15 días	mié 22/02/17	mar 14/03/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
27	Solicitud de No Objeción Bases de Licitación	2 días	vie 13/10/17	lun 16/10/17	vie 13/10/17	lun 16/10/17	100%	79		\$0.00		\$0.00				S
28	NOB DDLs	173 días	mié 22/02/17	lun 30/10/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
29	-----Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 17/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	81		\$0.00		\$0.00				S
30	-----Preparación de Ofertas	31 días	mié 18/10/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	82		\$0.00		\$0.00				S
31	-----Reunión aclaratoria	1 día	lun 06/11/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	84CC+13 días		\$0.00		\$0.00				S
32	-----Nombramiento del Comité de Evaluación	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	84CC+15 días		\$0.00		\$0.00				S
33	-----Enmienda	12 días	mar 07/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	85		\$0.00		\$0.00				S
34	-----Recepción de Ofertas	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	84,86		\$0.00		\$0.00				S
35	-----Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	1 día	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	88		\$0.00		\$0.00				S
36	-----Apertura de las Ofertas	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	88CC		\$0.00		\$0.00				S
37	-----Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	mié 22/02/17	vie 03/03/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
38	-----Evaluación de las Ofertas	30 días	vie 01/12/17	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%	88		\$0.00		\$0.00				S
39	-----Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	7 días	mié 17/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	92		\$0.00		\$0.00				S
40	-----No Objeción a la Adjudicación	7 días	vie 26/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	0%	93		\$0.00		\$0.00				S
41	-----Proceso de adjudicación	15 días	mar 06/02/18	lun 26/02/18	NOD	NOD	0%	94		\$0.00		\$0.00				S
42	-----Comunicación de la Adjudicación	7 días	mar 27/02/18	mié 07/03/18	NOD	NOD	0%	95		\$0.00		\$0.00				S
43	-----Delegación de firma	5 días	jue 08/03/18	mié 14/03/18	NOD	NOD	0%	96		\$0.00		\$0.00				S
44	-----Elaboración del Contrato	20 días	jue 08/03/18	mié 04/04/18	NOD	NOD	0%	97CC		\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
45	Gestión de firmas de contrato	10 días	jue 05/04/18	mié 18/04/18	NOD	NOD	0%	98		\$0.00		\$0.00				s
46	Emisión de Acuerdo Ministerial	10 días	jue 19/04/18	jue 03/05/18	NOD	NOD	0%	99		\$0.00		\$0.00				s
47	Notificación del Acuerdo	10 días	vie 04/05/18	jue 17/05/18	NOD	NOD	0%	100		\$0.00		\$0.00				s
48	Remisión de contratos firmados al BID	7 días	vie 18/05/18	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%	101		\$0.00		\$0.00				s
49	Orden de Compra	9 días	vie 04/05/18	mié 16/05/18	NOD	NOD	0%	101CC		\$0.00		\$0.00				s
50	Mobiliario (506) entregado y recepcionado	1237 días	lun 02/09/13	mié 11/07/18	NOD	NOD	0%			\$500,506.02		\$0.00				s
51	1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	494 días	lun 22/08/16	mié 08/08/18	lun 22/08/16	NOD	76%			\$27,221,671.53		\$11,587,021.25				s
52	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	494 días	lun 22/08/16	mié 08/08/18	lun 22/08/16	NOD	88%			\$16,057,382.74		\$10,756,290.75				s
53	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
54	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
55	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
56	Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. - Empresa A	383 días	mié 18/01/17	vie 20/07/18	mié 18/01/17	NOD	87%			\$5,158,497.74		\$3,419,580.85				s
57	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				s
58	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	131		\$0.00		\$0.00				s
59	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	132		\$0.00		\$0.00				s
60	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	133		\$0.00		\$0.00				s
61	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				s
62	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	135		\$0.00		\$0.00				s
63	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				s
64	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del-NEC	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17	NOD	NOD	0%	137		\$0.00		\$0.00				s
65	Ejecución financiera de módulos	192 días	jue 19/10/17	vie 20/07/18	jue 19/10/17	NOD	84%			\$5,158,497.74		\$3,419,580.85				s
66	Ejecución física de módulos	380 días	mié 18/01/17	mar 17/07/18	mié 18/01/17	NOD	87%			\$0.00		\$0.00				s
67	Modulos Educativos Lote 1	343 días	mié 18/01/17	vie 25/05/18	mié 18/01/17	vie 25/05/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
68	Modulos Educativos Lote 8	226 días	lun 28/08/17	mar 17/07/18	lun 28/08/17	NOD	71%			\$0.00		\$0.00				s
69	Farex, S.A. - Empresa B	279 días	mar 16/05/17	mié 20/06/18	mar 16/05/17	mié 20/06/18	100%			\$3,784,917.73		\$3,784,917.73				s
70	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				s
71	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	967		\$0.00		\$0.00				s
72	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	968		\$0.00		\$0.00				s
73	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	969		\$0.00		\$0.00				s
74	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	970		\$0.00		\$0.00				s
75	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	971		\$0.00		\$0.00				s
76	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	970		\$0.00		\$0.00				s
77	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del-NEC	1 día	lun 17/07/17	lun 17/07/17	NOD	NOD	0%	973		\$0.00		\$0.00				s
78	Ejecución financiera de módulos	130 días	jue 14/12/17	mié 20/06/18	jue 14/12/17	mié 20/06/18	100%			\$3,784,917.73		\$3,784,917.73				s
79	Ejecución física de módulos	120 días	lun 30/10/17	mié 18/04/18	lun 30/10/17	mié 18/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
80	Modulos Educativos Lote 2	120 días	lun 30/10/17	mié 18/04/18	lun 30/10/17	mié 18/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
81	Modulos Educativos Lote 7	110 días	lun 30/10/17	mié 04/04/18	lun 30/10/17	mié 04/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
82	Modulos Educativos Ciudad Peronia	52 días	vie 12/01/18	lun 26/03/18	vie 12/01/18	lun 26/03/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
83	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C	312 días	mar 16/05/17	mié 08/08/18	mar 16/05/17	NOD	79%			\$7,113,967.27		\$3,551,792.17				s
84	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				s
85	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1495		\$0.00		\$0.00				s
86	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1496		\$0.00		\$0.00				s
87	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1497		\$0.00		\$0.00				s
88	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1498		\$0.00		\$0.00				s
89	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1499		\$0.00		\$0.00				s
90	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1498		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
91	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del- NEC	1 día	jue 20/07/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	0%	1504		\$0.00		\$0.00				S
92	Ejecución financiera de módulos	194 días	mié 18/10/17	vie 20/07/18	mié 18/10/17	NOD	96%			\$7,113,967.27		\$3,551,792.17				S
93	Ejecución física de módulos	226 días	lun 18/09/17	mié 08/08/18	lun 18/09/17	NOD	78%			\$0.00		\$0.00				S
94	Módulos Educativos Lote 3	224 días	mié 20/09/17	mié 08/08/18	mié 20/09/17	NOD	88%			\$0.00		\$0.00				S
95	Módulos Educativos Lote 4	197 días	mar 10/10/17	mié 18/07/18	mar 10/10/17	NOD	90%			\$0.00		\$0.00				S
96	Módulos Educativos Lote 5	213 días	lun 18/09/17	mié 18/07/18	lun 18/09/17	NOD	91%			\$0.00		\$0.00				S
97	Módulos Educativos Lote 6	179 días	lun 06/11/17	mié 18/07/18	lun 06/11/17	NOD	63%			\$0.00		\$0.00				S
98	Módulos Educativos Lote 9	163 días	mar 28/11/17	mié 18/07/18	mar 28/11/17	NOD	7%			\$0.00		\$0.00				S
99	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	366 días	vie 10/02/17	vie 20/07/18	vie 10/02/17	NOD	18%			\$11,164,288.79		\$830,730.50				S
100	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
101	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
102	Proceso de Adquisición	218 días	lun 15/05/17	lun 26/03/18	lun 15/05/17	lun 26/03/18	100%			\$0.00		\$0.00				S
103	Módulos instalados y recepcionados	79 días	lun 02/04/18	vie 20/07/18	lun 02/04/18	NOD	12%			\$11,164,288.79		\$830,730.50				S
104	Farex, S.A. - Empresa A	76 días	jue 05/04/18	vie 20/07/18	jue 05/04/18	NOD	44%			\$2,671,755.19		\$830,730.50				S
105	Ejecución financiera de módulos	70 días	vie 13/04/18	vie 20/07/18	vie 13/04/18	NOD	12%			\$2,671,755.19		\$830,730.50				S
106	Ejecución física de módulos	69 días	jue 05/04/18	mié 11/07/18	jue 05/04/18	NOD	45%			\$0.00		\$0.00				S
107	Módulos Educativos - Lote 4	67 días	lun 09/04/18	mié 11/07/18	lun 09/04/18	NOD	35%			\$0.00		\$0.00				S
108	Módulos Educativos - Lote 6	46 días	jue 05/04/18	sáb 09/06/18	jue 05/04/18	NOD	86%			\$0.00		\$0.00				S
109	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B	79 días	lun 02/04/18	vie 20/07/18	lun 02/04/18	NOD	0%			\$8,492,533.60		\$0.00				S
110	Ejecución financiera de módulos	79 días	lun 02/04/18	vie 20/07/18	NOD	NOD	0%			\$8,492,533.60		\$0.00				S
111	Ejecución física de módulos	69 días	lun 02/04/18	dom 08/07/18	lun 02/04/18	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
112	Módulos Educativos - Lote 1	12 días	jue 21/06/18	dom 08/07/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
113	Módulos Educativos - Lote 2	25 días	vie 01/06/18	jue 05/07/18	vie 01/06/18	NOD	1%			\$0.00		\$0.00				S
114	Módulos Educativos - Lote 3	24 días	lun 04/06/18	jue 05/07/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
115	Módulos Educativos - Lote 5	24 días	lun 04/06/18	jue 05/07/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
116	Módulos Educativos - Lote 7	38 días	lun 02/04/18	jue 24/05/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
117	Módulos Educativos - Lote 8	24 días	lun 07/05/18	jue 07/06/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
118	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
119	Administración UE	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$311,636.74		\$311,636.74				S
120	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
121	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2017	238 días	lun 09/01/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
122	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
123	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
124	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
125	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
126	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2018	145 días	lun 23/10/17	jue 17/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
127	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
128	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
129	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,863.00		\$0.00				S
130	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,234.74		\$130,234.74				S
131	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$98,630.16		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
132	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	180 días	vie 31/03/17	vie 15/12/17	vie 31/03/17	vie 15/12/17	100%			\$181,402.00		\$181,402.00				s
133	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
134	Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina- 2017	37 días	jue 01/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	0%			\$4,000.00		\$0.00				s
135	Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina- 2018 para su utilización en actividades administrativas de la unidad ejecutora	61 días	mar 02/01/18	mar 27/03/18	NOD	NOD	0%			\$6,000.00		\$0.00				s
136	Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina	37 días	mié 10/01/18	jue 01/03/18	NOD	NOD	0%			\$45,000.00		\$0.00				s
137	Proceso de Adquisición: Combustible	30 días	jue 01/06/17	mié 12/07/17	NOD	NOD	0%			\$60,000.00		\$0.00				s
138	Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018	20 días	jue 01/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	0%			\$5,136.99		\$0.00				s
139	Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el resguardo de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	vie 09/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD	0%			\$30,000.00		\$0.00				s
140	Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	0%			\$25,000.00		\$0.00				s
141	Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo	35 días	mié 10/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%			\$40,000.00		\$0.00				s
142	Monto pendiente de asignar	1 día	mié 04/04/18	mié 04/04/18	NOD	NOD	0%			\$9,897.75		\$0.00				s

Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Pablo Fernando Godoy Reyes



Aprobado por: (nombre y firma) Sr. Luis Gabriel Calderón Aceituno - Director Ejecutivo
FODES



Luis Gabriel Calderón Aceituno
Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-



Fecha de actualización

9/7/2018 - 8:37 AM
