

Plan Anual de Ejecución


Mes reportado **Noviembre / 2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	10/12/2018		
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009		
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009		
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009		
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016		
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018		
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50		
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	215,600,000.00	Plazo de ejecución	100.00%		
Desembolsos realizados a la fecha	10,634,523.00	37.98%	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00	62.02%

Gráfica de Ejecución

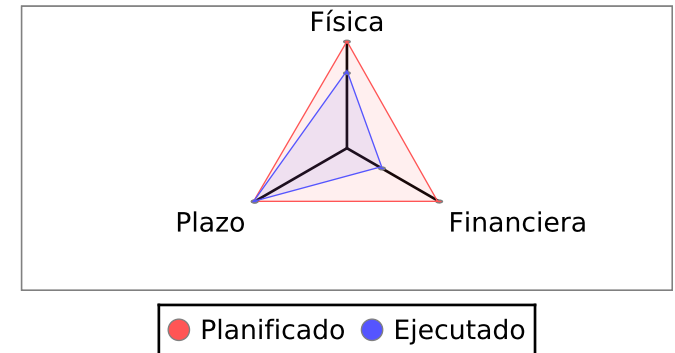

Tipo de cambio: 7.7 X 1 USD



Ejecución Presupuestaria Anual		Desembolsos Mensuales Noviembre		Indicadores de Avance Anuales 2018		Total	
Asignación Presupuestaria	145,000,000.00	Desembolso planificado en el	0.00	Desembolsos Acumulados del Año	18264390.02	Ejecución Financiera	65.00%
Presupuesto Vigente anual	118,324,536.00	Desembolso realizado en el mes	0.00	Porcentaje de desembolsos Realizados en el año Vs. Porcentaje de desembolsos	105.18% / 100.00%		
Presupuesto Devengado	118,324,534.19	Diferencia	0.00	Porcentaje de Gastos Realizados en el Año vs Porcentaje de Gastos	63.15% / 100.00%		
Porcentaje de Ejecución	100.00%	Próximo desembolso del mes	Mes	Plazo de ejecucion Actual	100.00%		
		Presupuesto planificado próximo	0.00	Desembolsos Anuales Vs. Presupuesto Vigente Anual	8.3499		


Metas año fiscal

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I		Meta cuatrimestre II		Meta cuatrimestre III		Meta anual	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.									
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	1082	265	0	460	0		1082	725
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros									
Mobiliario de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Suministros de oficina	Unidad	1		0		0		1	
Equipo de cómputo	Unidad	46		0		0		46	

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de documentos		Lanzamiento de evento		Recepción y evaluación de		Adjudicación		Firma de contrato	
		Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real	Planificado	Real
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros											
Mobiliario de oficina											
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	12/02/2018		19/02/2018		12/03/2018		13/03/2018		14/03/2018	
Suministros de oficina											
Toner, tintas	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	
Equipo de cómputo											
Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escaner	Comparación de Precios	09/02/2018		16/02/2018		09/03/2018		12/03/2018		13/03/2018	

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

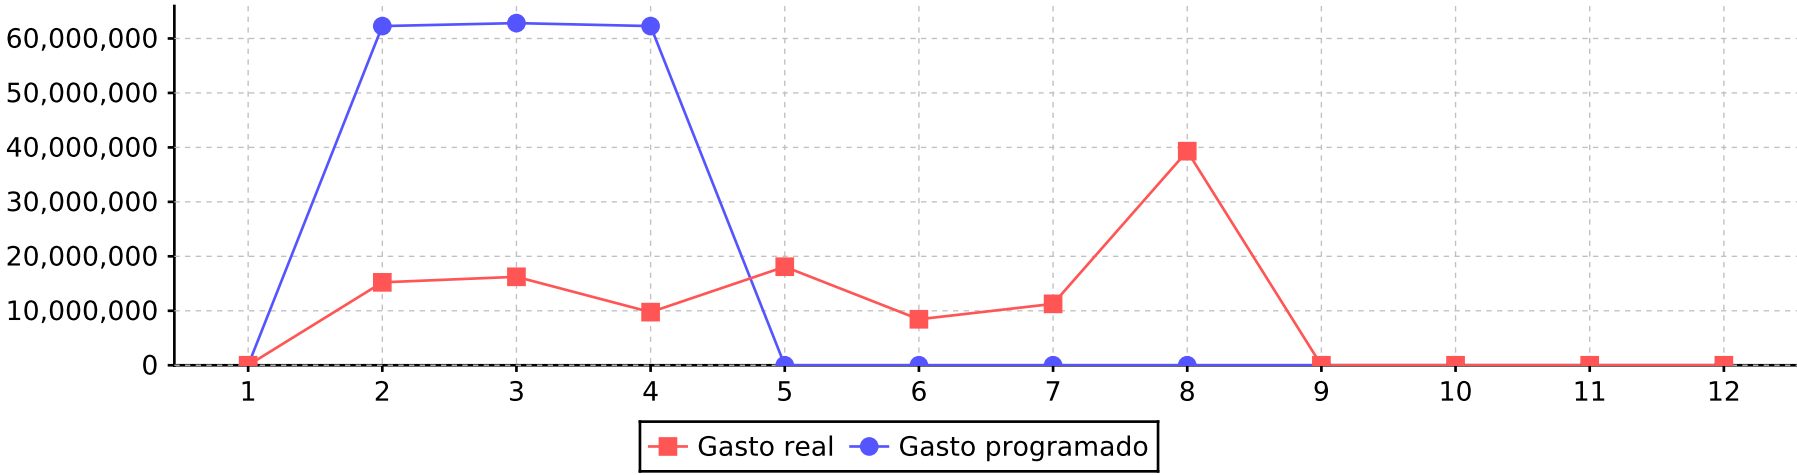

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Gasto real	0.00	15,220,703.14	16,239,501.38	9,752,216.14	18,091,794.14	8,440,143.40	11,269,792.38	39,310,383.61	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto programado	0.00	62,278,140.15	62,823,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Gasto real												118,324,534.19
Total Gasto programado												187,379,418.44

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
1	PEP_SMART_2018_FODES	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$20,120,336.53		\$20,120,336.53				S
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$19,808,710.44		\$19,808,710.44				S
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	355 días	lun 22/08/16	lun 22/01/18	lun 22/08/16	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
6	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
7	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
8	Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 07/11/16	mar 30/08/16	lun 07/11/16	100%	5		\$0.00		\$0.00				S
9	Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 07/11/16	mar 08/11/16	lun 07/11/16	mar 08/11/16	100%	7		\$0.00		\$0.00				S
10	Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	20 días	mié 09/11/16	mar 06/12/16	NOD	NOD	0%	8		\$0.00		\$0.00				S
11	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	100%	8,9		\$0.00		\$0.00				S
12	Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 09/11/16	mar 15/11/16	mié 09/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00		\$0.00				S
13	Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00		\$0.00				S
14	Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00		\$0.00				S
15	NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00		\$0.00				S
16	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	100%	14		\$0.00		\$0.00				S
17	Preparación de Ofertas	25 días	vie 02/12/16	jue 12/01/17	vie 02/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				S
18	Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8 días		\$0.00		\$0.00				S
19	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				S
20	Enmienda a Bases de Licitación	1 día	vie 13/01/17	vie 13/01/17	NOD	NOD	0%	16		\$0.00		\$0.00				S
21	Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16,18		\$0.00		\$0.00				S
22	Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	NOD	NOD	0%	20		\$0.00		\$0.00				S
23	Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20,21		\$0.00		\$0.00				S
24	Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	lun 02/09/13	mié 11/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
25	Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 02/03/17	vie 13/01/17	jue 02/03/17	100%	22		\$0.00		\$0.00				S
26	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 03/03/17	mar 18/04/17	vie 03/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00		\$0.00				S
27	No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00		\$0.00				S
28	Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 04/05/17	vie 28/04/17	jue 04/05/17	100%	26		\$0.00		\$0.00				S
29	Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00		\$0.00				S
30	Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	jue 18/05/17	mié 07/06/17	100%	28		\$0.00		\$0.00				S
31	Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17	jue 08/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00		\$0.00				S
32	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00		\$0.00				S
33	Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				S
34	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				S
35	Oferta de Convino	2 días	mar 18/07/17	mié 19/07/17	NOD	NOD	0%	32CC		\$0.00		\$0.00				S
36	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
37	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	97 días	vie 01/09/17	lun 22/01/18	vie 01/09/17	lun 22/01/18	100%			\$1,404,128.14		\$1,404,128.14				S
38	Lote 1	15 días	vie 01/09/17	vie 01/09/17	vie 01/09/17	vie 01/09/17	100%	32		\$206,104.63		\$206,104.63				S
39	Lote 2	24 días	vie 15/12/17	lun 22/01/18	vie 15/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$149,953.44		\$149,953.44				S
40	Lote 3	15 días	vie 01/09/17	vie 22/09/17	vie 01/09/17	vie 22/09/17	100%	32		\$169,577.30		\$169,577.30				S
41	Lote 4	20 días	jue 21/12/17	lun 22/01/18	jue 21/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$110,511.48		\$110,511.48				S
42	Lote 5	18 días	mar 26/12/17	lun 22/01/18	mar 26/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,659.58		\$167,659.58				S
43	Lote 6	17 días	vie 29/12/17	lun 22/01/18	vie 29/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$107,576.58		\$107,576.58				S
44	Lote 7	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$233,689.11		\$233,689.11				S
45	Lote 8	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$167,540.64		\$167,540.64				S
46	Lote 9	17 días	jue 28/12/17	lun 22/01/18	jue 28/12/17	lun 22/01/18	100%	32		\$91,515.38		\$91,515.38				S
47	Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general	30 días	lun 02/09/13	vie 11/10/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
48	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
49	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
50	Proceso de Adquisición	150 días	mié 22/02/17	mar 26/09/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
51	Mobiliario (506) entregado y recepcionado	1237 días	lun-02/09/13	mié-11/07/18		NOD	0%			\$500,506.00		\$0.00				S
52	1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	1466 días	dom 01/09/13	dom 16/06/19	dom 01/09/13	NOD	99%			\$18,404,582.30		\$18,404,582.30				S
53	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	705 días	lun 22/08/16	dom 16/06/19	lun 22/08/16	dom 16/06/19	100%			\$15,762,277.23		\$15,762,277.23				S
54	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				S
55	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
56	Preparación de Bases de Licitación y aprobación Interna	9 días	lun 29/08/16	jue 08/09/16	lun 29/08/16	jue 08/09/16	100%	112		\$0.00		\$0.00				S
57	Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de Licitación	18 días	vie 09/09/16	mié 05/10/16	vie 09/09/16	mié 05/10/16	100%	114		\$0.00		\$0.00				S
58	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e internacionales	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	100%	115		\$0.00		\$0.00				S
59	Preparación de Ofertas	38 días	vie 14/10/16	mar 06/12/16	vie 14/10/16	mar 06/12/16	100%	116CC		\$0.00		\$0.00				S
60	Reunión aclaratoria	1 día	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	100%	117CC+13 días		\$0.00		\$0.00				S
61	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	100%	116CC+7 días		\$0.00		\$0.00				S
62	Emisión a Bases de Licitación	8 días	mié-07/12/16	jue-15/12/16		NOD	0%	117		\$0.00		\$0.00				S
63	Recepción de Ofertas	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	117,119,120		\$0.00		\$0.00				S
64	Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	44 días	jue-08/12/16	mar-14/02/17		NOD	0%	121		\$0.00		\$0.00				S
65	Apertura de las Ofertas	0 días	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	121CC,122		\$0.00		\$0.00				S
66	Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	jue-08/12/16	vie-16/12/16		NOD	0%	123		\$0.00		\$0.00				S
67	Evaluación de las Ofertas	36 días	mié 07/12/16	jue 02/02/17	mié 07/12/16	jue 02/02/17	100%	123,124		\$0.00		\$0.00				S
68	Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	47 días	vie 03/02/17	mar 11/04/17	vie 03/02/17	mar 11/04/17	100%	125		\$0.00		\$0.00				S
69	No Objeción a la Adjudicación	8 días	mié 12/04/17	vie 21/04/17	mié 12/04/17	vie 21/04/17	100%	126		\$0.00		\$0.00				S
70	Comunicación de la Adjudicación	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	100%	127		\$0.00		\$0.00				S
71	Delegación de firma	8 días	jue 04/05/17	lun 15/05/17	jue 04/05/17	lun 15/05/17	100%	128		\$0.00		\$0.00				S
72	Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. - Empresa A	602 días	mié 18/01/17	mar 11/06/19	mié 18/01/17	mar 11/06/19	100%			\$5,093,217.85		\$5,093,217.85				S
73	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				S
74	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	131		\$0.00		\$0.00				S
75	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	132		\$0.00		\$0.00				S
76	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	133		\$0.00		\$0.00				S
77	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				S
78	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	135		\$0.00		\$0.00				S
79	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	134		\$0.00		\$0.00				S
80	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del NEG	1 día	mié-12/07/17	mié-12/07/17		NOD	0%	137		\$0.00		\$0.00				S
81	Ejecución financiera de módulos	235 días	jue 19/10/17	vie 21/09/18	jue 19/10/17	vie 21/09/18	100%			\$5,093,217.85		\$5,093,217.85				S
82	Ejecución física de módulos	602 días	mié 18/01/17	mar 11/06/19	mié 18/01/17	mar 11/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				S
83	Farex, S.A. - Empresa B	278 días	mar 16/05/17	mar 19/06/18	mar 16/05/17	mar 19/06/18	100%			\$3,787,492.51		\$3,787,492.51				S
84	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				S
85	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	858		\$0.00		\$0.00				S
86	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	859		\$0.00		\$0.00				S
87	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	860		\$0.00		\$0.00				S
88	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	861		\$0.00		\$0.00				S
89	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	862		\$0.00		\$0.00				S
90	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	861		\$0.00		\$0.00				S
91	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del NEG	1 día	lun-17/07/17	lun-17/07/17		NOD	0%	864		\$0.00		\$0.00				S
92	Ejecución financiera de módulos	129 días	jue 14/12/17	mar 19/06/18	jue 14/12/17	mar 19/06/18	100%			\$3,787,492.51		\$3,787,492.51				S
93	Ejecución física de módulos	120 días	lun 30/10/17	mié 18/04/18	lun 30/10/17	mié 18/04/18	100%			\$0.00		\$0.00				S
94	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C	523 días	mar 16/05/17	dom 16/06/19	mar 16/05/17	dom 16/06/19	100%			\$6,881,566.87		\$6,881,566.87				S
95	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	129		\$0.00		\$0.00				S
96	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1386		\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
97	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1387		\$0.00		\$0.00				s
98	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1388		\$0.00		\$0.00				s
99	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1389		\$0.00		\$0.00				s
100	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1390		\$0.00		\$0.00				s
101	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1389		\$0.00		\$0.00				s
102	Registro de contrato en SIGES hasta obtención del	1 día	jue 20/07/17	jue 20/07/17	NOD	NOD	0%	1392		\$0.00		\$0.00				s
103	Ejecución financiera de módulos	237 días	mié 18/10/17	vie 21/09/18	mié 18/10/17	vie 21/09/18	100%			\$6,881,566.87		\$6,881,566.87				s
104	Ejecución física de módulos	437 días	lun 18/09/17	dom 16/06/19	lun 18/09/17	dom 16/06/19	100%			\$0.00		\$0.00				s
105	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	1287 días	dom 01/09/13	vie 21/09/18	dom 01/09/13	NOD	99%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
106	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
107	Proceso de Adquisición	218 días	lun 15/05/17	lun 26/03/18	lun 15/05/17	lun 26/03/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
108	Preparación de Bases de Licitación y Aprobación Interna	8 días	lun 15/05/17	jue 25/05/17	lun 15/05/17	jue 25/05/17	100%	2477		\$0.00		\$0.00				s
109	Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas	15 días	lun 02/09/13	vie 20/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
110	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	9 días	vie 26/05/17	mié 07/06/17	vie 26/05/17	mié 07/06/17	100%	2479		\$0.00		\$0.00				s
111	No objeción a los Documentos de Licitación	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	jue 08/06/17	vie 09/06/17	100%	2481		\$0.00		\$0.00				s
112	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e Internacionales	17 días	lun 12/06/17	mar 04/07/17	lun 12/06/17	mar 04/07/17	100%	2482		\$0.00		\$0.00				s
113	Preparación de Ofertas	31 días	mar 04/07/17	vie 18/08/17	mar 04/07/17	vie 18/08/17	100%	2483		\$0.00		\$0.00				s
114	Reunión aclaratoria	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	100%	2483CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
115	Nombramiento del Comité de Evaluación	25 días	lun 26/06/17	lun 31/07/17	lun 26/06/17	lun 31/07/17	100%	2483CC+10 días		\$0.00		\$0.00				s
116	Enmienda a Bases de Licitación	28 días	mié 26/07/17	lun 04/09/17	NOD	NOD	0%	2485		\$0.00		\$0.00				s
117	Recepción de Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	24,842,486		\$0.00		\$0.00				s
118	Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
119	Apertura de las Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	2488CC		\$0.00		\$0.00				s
120	Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo	8 días	lun 02/09/13	mié 11/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
121	Evaluación de las Ofertas	37 días	mar 22/08/17	vie 13/10/17	mar 22/08/17	vie 13/10/17	100%	2490		\$0.00		\$0.00				s
122	Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	100%	2492		\$0.00		\$0.00				s
123	No Objeción a la Adjudicación	16 días	mar 17/10/17	mar 07/11/17	mar 17/10/17	mar 07/11/17	100%	2493		\$0.00		\$0.00				s
124	Comunicación de la Adjudicación	18 días	mié 08/11/17	vie 01/12/17	mié 08/11/17	vie 01/12/17	100%	2494		\$0.00		\$0.00				s
125	Delegación de firma	11 días	lun 04/12/17	lun 18/12/17	lun 04/12/17	lun 18/12/17	100%	2495		\$0.00		\$0.00				s
126	Elaboración del Contrato	30 días	mié 08/11/17	mar 19/12/17	mié 08/11/17	mar 19/12/17	100%	2495CC		\$0.00		\$0.00				s
127	Gestión de firmas de contrato	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	100%	2497		\$0.00		\$0.00				s
128	Emisión de Acuerdo Ministerial	12 días	jue 21/12/17	jue 11/01/18	jue 21/12/17	jue 11/01/18	100%	2498		\$0.00		\$0.00				s
129	Notificación del Acuerdo	52 días	vie 12/01/18	lun 26/03/18	vie 12/01/18	lun 26/03/18	100%	2499		\$0.00		\$0.00				s
130	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	lun 26/03/18	lun 26/03/18	lun 26/03/18	lun 26/03/18	100%	2500		\$0.00		\$0.00				s
131	Orden de Compra o Contrato	2 días	vie 12/03/18	lun 15/03/18	NOD	NOD	0%	2500CC		\$0.00		\$0.00				s
132	Módulos instalados y recepcionados	1287 días	dom 01/09/13	vie 21/09/18	dom 01/09/13	NOD	99%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
133	Farex, S.A. - Empresa A	119 días	jue 05/04/18	vie 21/09/18	jue 05/04/18	vie 21/09/18	100%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
134	Ejecución financiera de módulos	83 días	vie 25/05/18	vie 21/09/18	vie 25/05/18	vie 21/09/18	100%			\$2,642,305.07		\$2,642,305.07				s
135	Ejecución física de módulos	80 días	jue 05/04/18	vie 27/07/18	jue 05/04/18	vie 27/07/18	100%			\$0.00		\$0.00				s
136	Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
137	Ejecución financiera de módulos	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
138	Ejecución física de módulos	0 días	dom 01/09/13	dom 01/09/13	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
139	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
140	Administración UE	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$311,626.09		\$311,626.09				s
141	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				s


Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/M)
142	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2017	238 días	lun 09/01/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
143	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
144	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
145	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017	1156 días	lun 02/09/13	lun 19/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				S
146	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018	140 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
147	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2018	145 días	lun 23/10/17	jue 17/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
148	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
149	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				S
150	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,863.00		\$0.00				S
151	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,224.09		\$130,224.09				S
152	Elaboración de TDR	3 días	lun 09/01/17	mié 11/01/17	lun 09/01/17	mié 11/01/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
153	Causa: Poco conocimiento-Riesgo:Trámites Engorrosos-Impacto: Atrazo en fechas planificadas	20 días	jue 12/01/17	mié 08/02/17	NOD	NOD	0%	4059		\$0.00		\$0.00				S
154	NOB a TDR	103 días	jue 12/01/17	jue 08/06/17	jue 12/01/17	jue 08/06/17	100%	4059,060		\$0.00		\$0.00				S
155	Publicación / Invitación	5 días	vie 14/04/17	vie 14/04/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
156	Evaluación de postulantes	6 días	vie 09/06/17	vie 16/06/17	vie 09/06/17	vie 16/06/17	100%	4062		\$0.00		\$0.00				S
157	NOB a Evaluación	2 días	lun 19/06/17	mar 20/06/17	lun 19/06/17	mar 20/06/17	100%	4063		\$0.00		\$0.00				S
158	Gestión interna y firma de contrato	9 días	mié 21/06/17	lun 03/07/17	mié 21/06/17	lun 03/07/17	100%	4064		\$0.00		\$0.00				S
159	Pago mes Marzo	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	NOD	NOD	0%	4065		\$24,000.00		\$0.00				S
160	Pago Mes Abril	18 días	lun 21/07/17	vie 25/08/17	NOD	NOD	0%	4066		\$24,000.00		\$0.00				S
161	Pago Mes Mayo	1 día	lun 28/08/17	lun 28/08/17	NOD	NOD	0%	4067		\$24,000.00		\$0.00				S
162	Pago Mes Junio	1 día	mar 29/08/17	mar 29/08/17	NOD	NOD	0%	4068		\$24,000.00		\$0.00				S
163	Pago Mes Julio	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	mar 04/07/17	vie 28/07/17	100%	4069		\$19,754.85		\$19,754.85				S
164	Pago Mes Agosto	22 días	lun 31/07/17	mié 30/08/17	lun 31/07/17	mié 30/08/17	100%	4070		\$22,230.64		\$22,230.64				S
165	Pago Mes Septiembre	21 días	jue 31/08/17	vie 29/09/17	jue 31/08/17	vie 29/09/17	100%	4071		\$22,042.69		\$22,042.69				S
166	Pago Mes Octubre	21 días	lun 02/10/17	lun 02/10/17	mar 31/10/17	mar 31/10/17	100%	4072		\$22,063.93		\$22,063.93				S
167	Pago Mes Noviembre	21 días	mié 01/11/17	mié 29/11/17	mié 01/11/17	mié 29/11/17	100%	4073		\$22,065.64		\$22,065.64				S
168	Pago Mes Diciembre	14 días	vie 01/12/17	mié 20/12/17	vie 01/12/17	mié 20/12/17	100%	4074		\$22,066.34		\$22,066.34				S
169	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2018	149 días	lun 23/10/17	mié 23/05/18	NOD	NOD	0%			\$98,630.18		\$0.00				S
170	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	180 días	vie 31/03/17	vie 15/12/17	vie 31/03/17	vie 15/12/17	100%			\$181,402.00		\$181,402.00				S
171	Preparación de Bases de Licitación	25 días	vie 31/03/17	lun 08/05/17	vie 31/03/17	lun 08/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				S
172	Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación	30 días	mar 09/05/17	lun 19/06/17	mar 09/05/17	lun 19/06/17	100%	4089		\$0.00		\$0.00				S
173	Aprobación Interna de Bases de Licitación	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	100%	4090		\$0.00		\$0.00				S
174	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	100%	4091		\$0.00		\$0.00				S
175	Preparación de Ofertas	33 días	mié 05/07/17	mar 22/08/17	mié 05/07/17	mar 22/08/17	100%	4092		\$0.00		\$0.00				S
176	Reunión aclaratoria	1 día	mié 12/07/17	NOD	NOD	NOD	0%	4093CC+5 días		\$0.00		\$0.00				S
177	Nombramiento del Comité de Evaluación	10 días	lun 17/07/17	lun 31/07/17	lun 17/07/17	lun 31/07/17	100%	4093CC+8 días		\$0.00		\$0.00				S
178	Recepción de Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	4093		\$0.00		\$0.00				S
179	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	4096CC		\$0.00		\$0.00				S
180	Evaluación de las Ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	mié 23/08/17	mar 29/08/17	100%	4096CC		\$0.00		\$0.00				S
181	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	0 días	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	100%	4098		\$0.00		\$0.00				S
182	No Objeción a la Adjudicación	4 días	mié 30/08/17	lun 04/09/17	mié 30/08/17	lun 04/09/17	100%	4099		\$0.00		\$0.00				S
183	Comunicación de la Adjudicación	3 días	mar 05/09/17	jue 07/09/17	mar 05/09/17	jue 07/09/17	100%	4100		\$0.00		\$0.00				S
184	Delegación de firma	7 días	jue 05/10/17	lun 16/10/17	jue 05/10/17	lun 16/10/17	100%	4101		\$0.00		\$0.00				S
185	Elaboración del Contrato	3 días	mar 17/10/17	jue 19/10/17	mar 17/10/17	jue 19/10/17	100%	4102		\$0.00		\$0.00				S
186	Gestión de firmas de contrato	2 días	vie 20/10/17	lun 23/10/17	vie 20/10/17	lun 23/10/17	100%	4103		\$0.00		\$0.00				S
187	Emisión de Acuerdo Ministerial	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	mar 24/10/17	jue 02/11/17	100%	4104		\$0.00		\$0.00				S
188	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	100%	4105		\$0.00		\$0.00				S
189	Orden de Compra	1 día	mié 23/11/17	mié 23/11/17	NOD	NOD	0%	4106		\$0.00		\$0.00				S
190	Entrega de vehículo	17 días	jue 23/11/17	vie 15/12/17	jue 23/11/17	vie 15/12/17	100%	4107		\$181,402.00		\$181,402.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (S/N)
191	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
192	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2017	27 días	jue 01/06/17	vie 21/07/17	NOD	NOD	0%			\$4,000.00		\$0.00				s
193	Proceso de Adquisición: Suministros y útiles de oficina 2018 para su utilización en actividades administrativas de la unidad ejecutora	61 días	mar 02/01/18	mar 27/03/18	NOD	NOD	0%			\$6,000.00		\$0.00				s
194	Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina	27 días	mié 10/01/18	jue 01/03/18	NOD	NOD	0%			\$45,000.00		\$0.00				s
195	Proceso de Adquisición: Combustible	30 días	jue 01/06/17	mie 12/07/17	NOD	NOD	0%			\$60,000.00		\$0.00				s
196	Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018	20 días	jue 01/06/17	mié 28/06/17	NOD	NOD	0%			\$5,136.99		\$0.00				s
197	Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el resguardo de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	vie 09/06/17	mar 04/07/17	NOD	NOD	0%			\$30,000.00		\$0.00				s
198	Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los vehículos adquiridos por el programa	18 días	lun 03/07/17	jue 27/07/17	NOD	NOD	0%			\$25,000.00		\$0.00				s
199	Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo	25 días	mié 10/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%			\$40,000.00		\$0.00				s
200	Monto pendiente de asignar	1 día	mié 04/04/18	mié 04/04/18	NOD	NOD	0%			\$0,897.75		\$0.00				s



Observaciones / Desafíos

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Pablo Fernando Godoy Reyes



Aprobado por: (nombre y firma) Sr. David Estuardo Escobar Vega - Director Ejecutivo
FODES



Fecha de actualización

10/12/2018 - 8:44 AM
